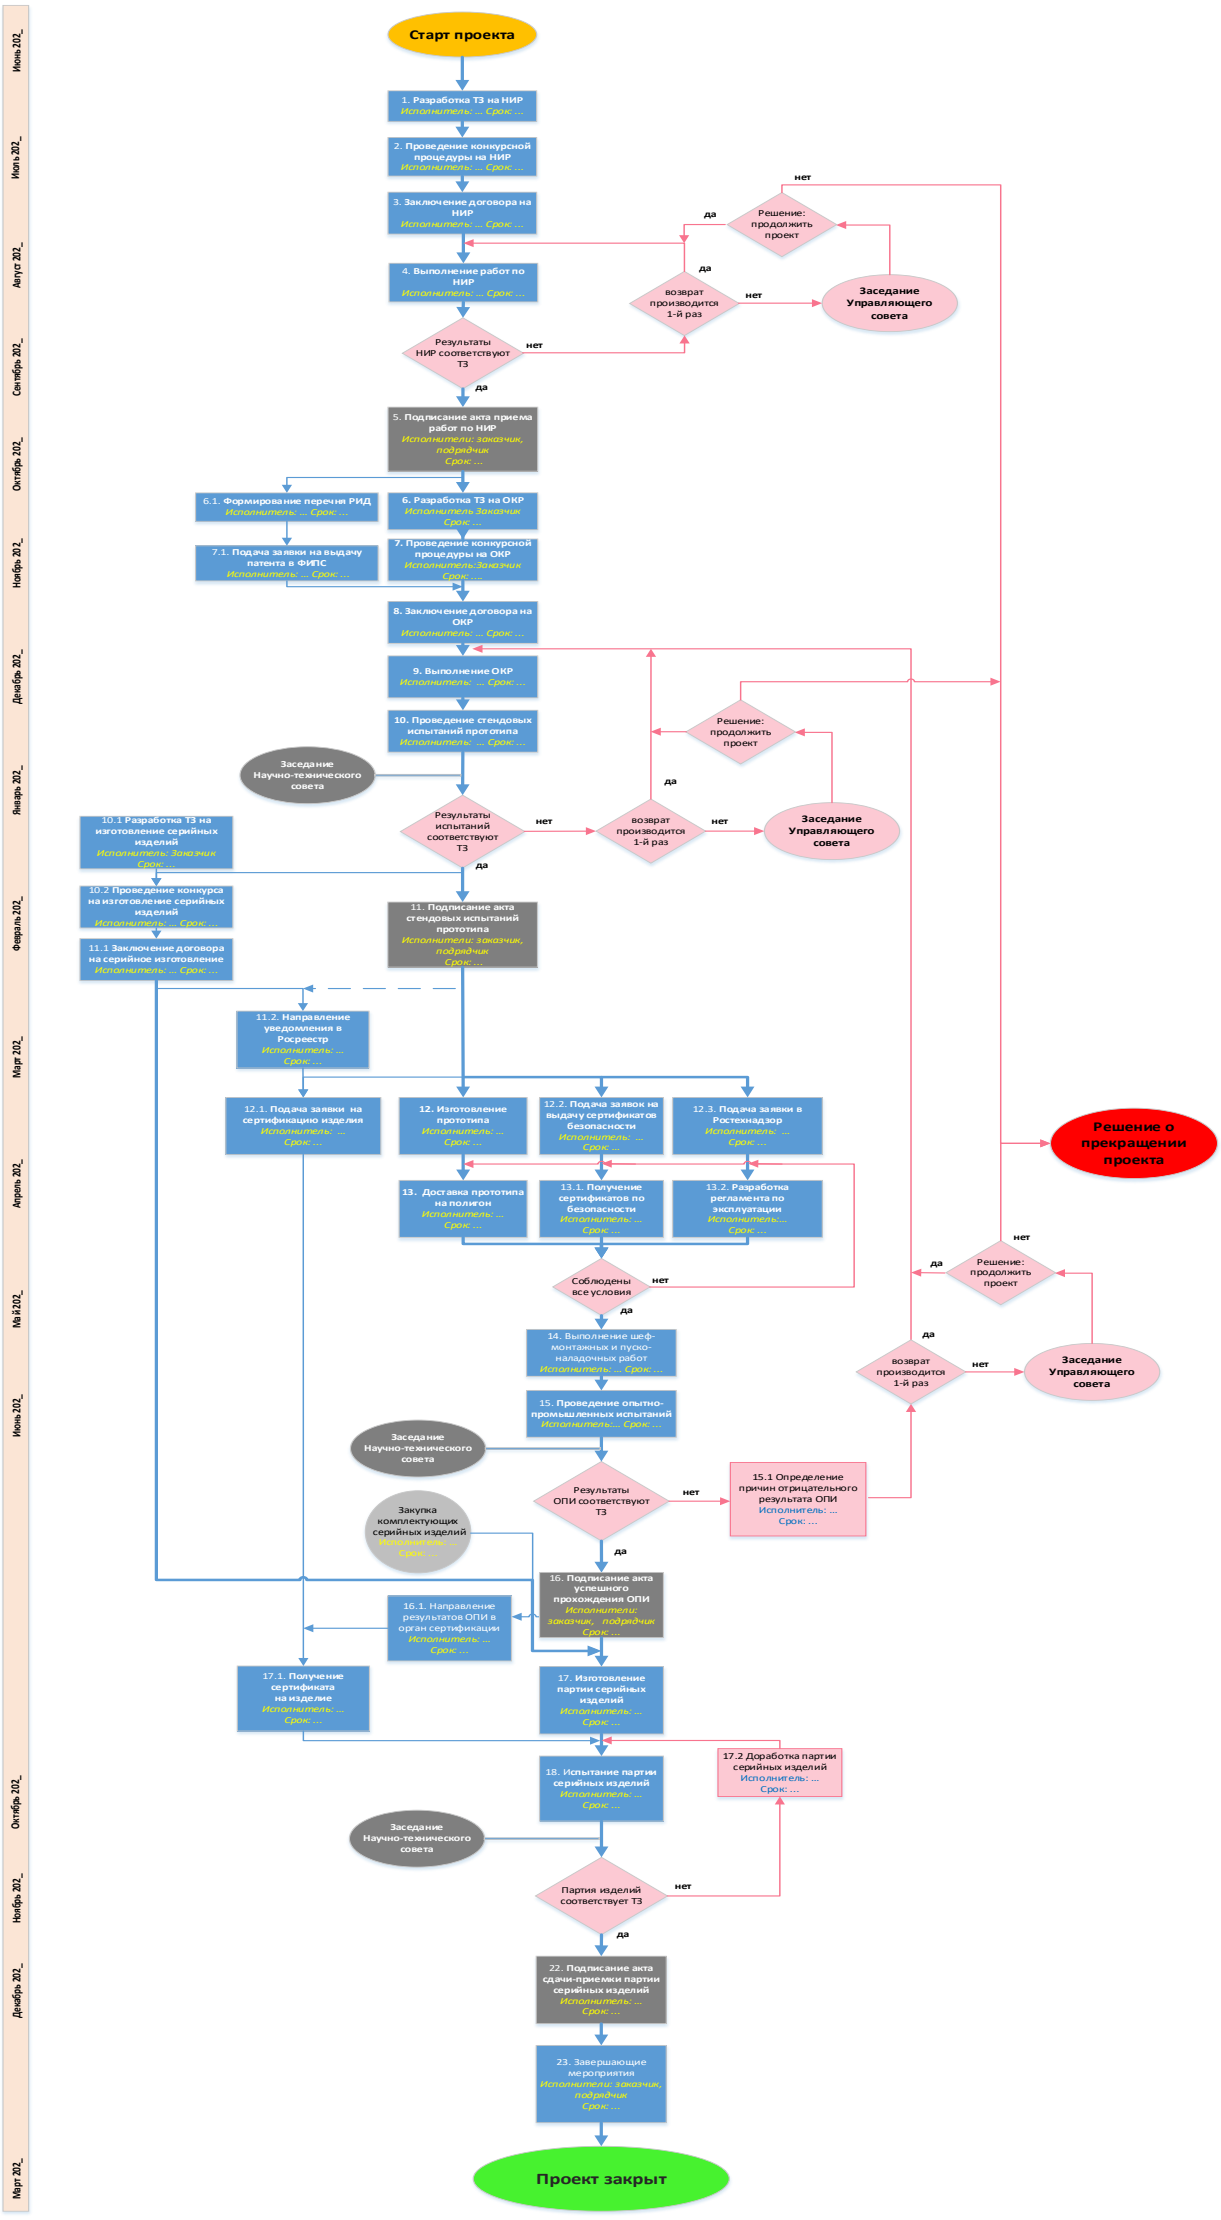
Июнь 202_
Июль 202_
Август 202_
Сентябрь 202_
Октябрь 202_
Ноябрь 202_
Декабрь 202_
Январь 202_
Февраль 202_
Март 202_
Апрель 202_
Май 202_
Июнь 202_
Октябрь 202_
Ноябрь 202_
Декабрь 202_
Март 202_
Старт проекта
1. Разработка ТЗ на НИР
Исполнитель: ... Срок: ...
2. Проведение конкурсной процедуры на НИР
Исполнитель: ... Срок: ...
3. Заключение договора на НИР
Исполнитель: ... Срок: ...
4. Выполнение работ по НИР
Исполнитель: ... Срок: ...
Результаты НИР соответствуют ТЗ
нет
да
возврат производится 1-й раз
да
нет
Заседание Управляющего совета
Решение: продолжить проект
нет
да
5. Подписание акта приема работ по НИР
Исполнители: заказчик, подрядчик
Срок: ...
6.1. Формирование перечня РИД
Исполнитель: ... Срок: ...
7.1. Подача заявки на выдачу патента в ФИПС
Исполнитель: ... Срок: ...
6. Разработка ТЗ на ОКР
Исполнитель:Заказчик
Срок: ...
7. Проведение конкурсной процедуры на ОКР
Исполнитель:Заказчик
Срок: ...
8. Заключение договора на ОКР
Исполнитель: ... Срок: ...
9. Выполнение ОКР
Исполнитель: ... Срок: ...
10. Проведение стендовых испытаний прототипа
Исполнитель: ... Срок: ...
Заседание Научно-технического совета
Результаты испытаний соответствуют ТЗ
нет
возврат производится 1-й раз
нет
да
Заседание Управляющего совета
Решение: продолжить проект
да
10.1 Разработка ТЗ на изготовление серийных изделий
Исполнитель: Заказчик
Срок: ...
10.2 Проведение конкурса на изготовление серийных изделий
Исполнитель: ... Срок: ...
11.1 Заключение договора на серийное изготовление
Исполнитель: ... Срок: ...
11. Подписание акта стендовых испытаний прототипа
Исполнители: заказчик, подрядчик
Срок: ...
11.2. Направление уведомления в Росреестр
Исполнитель: ...
Срок: ...
12.1. Подача заявки на сертификацию изделия
Исполнитель: ...
Срок: ...
12. Изготовление прототипа
Исполнитель: ...
Срок: ...
12.2. Подача заявок на выдачу сертификатов безопасности
Исполнитель: ...
Срок: ...
12.3. Подача заявки в Ростехнадзор
Исполнитель: ...
Срок: ...
Решение о прекращении проекта
13. Доставка прототипа на полигон
Исполнитель: ...
Срок: ...
13.1. Получение сертификатов по безопасности
Исполнитель: ...
Срок: ...
13.2. Разработка регламента по эксплуатации
Исполнитель:...
Срок: ...
Соблюдены все условия
нет
да
Решение: продолжить проект
нет
да
14. Выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ
Исполнитель: ... Срок: ...
возврат производится 1-й раз
да
нет
Заседание Управляющего совета
15. Проведение опытно-промышленных испытаний
Исполнитель:... Срок: ...
Заседание Научно-технического совета
Результаты ОПИ соответствуют ТЗ
нет
15.1 Определение причин отрицательного результата ОПИ
Исполнитель: ...
Срок: ...
Закупка комплектующих серийных изделий
Исполнитель: ...
Срок: ...
да
16. Подписание акта успешного прохождения ОПИ
Исполнители: заказчик, подрядчик
Срок: ...
16.1. Направление результатов ОПИ в орган сертификации
Исполнитель: ...
Срок: ...
17.1. Получение сертификата на изделие
Исполнитель: ...
Срок: ...
17. Изготовление партии серийных изделий
Исполнитель: ...
Срок: ...
17.2 Доработка партии серийных изделий
Исполнитель: ...
Срок: ...
18. Испытание партии серийных изделий
Исполнитель: ...
Срок: ...
Заседание Научно-технического совета
Партия изделий соответствует ТЗ
нет
да
22. Подписание акта сдачи-приемки партии серийных изделий
Исполнитель: ...
Срок: ...
23. Завершающие мероприятия
Исполнители: заказчик, подрядчик
Срок: ...
Проект закрыт
